

沈阳俊生机械制造有限公司燃气锅炉改造竣工

环境保护验收意见

沈阳俊生机械制造有限公司依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、沈阳市关于燃煤锅炉使用清洁能源改造等要求组织沈阳俊生机械制造有限公司燃气锅炉改造竣工验收。建设单位、验收监测及验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

沈阳俊生机械制造有限公司燃气锅炉改造工程 2017 年根据沈阳市环保局、沈阳市财政局、沈阳市房产局《关于印发沈阳市大气治理资金支持燃煤锅炉淘汰项目实施管理办法的通知》（沈环保【2016】151 号）立项批准实施。工程位于沈阳俊生机械制造有限公司院内。拆除原有两吨燃煤锅炉，更换改建为 4 台 QHwLN-0.44-Q 燃气锅炉。锅炉主要用于冬季采暖。全年工作 150 天，每天运行 20 小时，全年运行 3000 小时。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

设备不产生污水。操作人员内部调剂无新增人员。生活污水经厂内化粪池降解处理后，排入市政污水管网，最终入西部污水处理厂。

2、废气

锅炉废气通过 8 米高排气筒有组织排放。

3、噪声

锅炉及辅助设备置于封闭厂房内，风机、电机及泵类基础采取减振措施。采用隔声、消声、减震处理等各种减噪措施。

4、固体废物

员工日常生活产生的生活垃圾，统一送城市垃圾填埋场填埋。

三、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该锅炉正常运行，运行负荷达到 75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废气

锅炉废气污染物平均排放浓度符合 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉的规定要求。

3、噪声

锅炉运行时厂界噪声昼、夜间均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类标准的规定要求。

五、验收结论与建议

工程根据沈阳市环保局沈环保【2016】151 号立项批准实施，拆除原有两吨燃煤锅炉，更换改建为 4 台 QHVLN-0.44-Q 燃气锅炉。采用天然气替代燃煤落实了清洁能源污染防治措施；根据现场检查、验收监测及工程竣工环境保护验收报告结果，工程满足排放标准要求，该工程可以通过竣工环境保护验收。



验收成员：

附图 1:




制定



10114

附图 2:

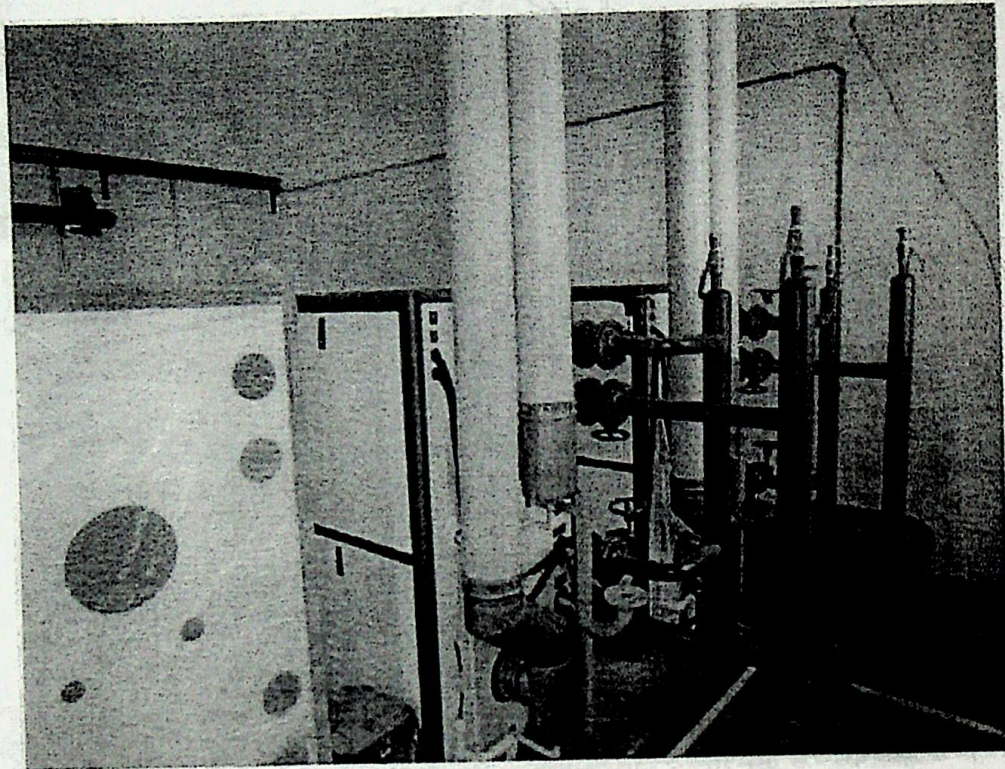

附图 3:

 铁岭众缘全预混冷凝热水模块锅炉 TIE LING ZHONGYUAN Fully premixed condensing hot water			
锅炉型号 Boiler model		燃气种类 Type of gas	
输出功率 Output	440 KW	额定压力 Nominal pressure	
序列号 Serial number	725 180001	额定出水温度 Rated OUT W _{IN} °C	
制造日期 Manufacturing date	2018.3	额定燃气压力 Gas pressure MIN/MAX	
铁岭众缘环保设备制造有限公司 TIE LING ZHONGYUAN Environmental equipment manufacturing Co., Ltd.			

注 意 事 项

为了您的安全
请仔细阅读并严格执行下列注意事项:

1. 锅炉周围不要堆放易燃易爆性的可燃液体的容器。
2. 锅炉运行之前必须检查管道, 仪表是否正常, 如检测到有燃气泄漏, 切勿启动。
3. 禁止使用任何电气开关, 开闭通风, 立警示牌, 切断电源。
3. 锅炉内部及内部部分应保证密封性, 严禁通风。

沈阳俊生机械制造有限公司燃气锅炉项目竣工环境保护验收组名单

序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	张艳玲	沈阳俊生机械制造有限公司	主任	13940467936	张艳玲
2	任天楚	沈阳克林环境检测有限公司	经理	15040007285	任天楚
3	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	经理	15840287401	关欣
4	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	鹿杰
5					
6					
7					
8					
9					

2018年12月17日

